



Правительство
Санкт-Петербурга

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕТЕРБУРГГАЗ



**Доклад к заседанию Общественного консультативно-экспертного совета при
Комитете по тарифам Санкт-Петербурга с участием вице-губернатора Санкт-
Петербурга И.Н. Албина
20.09.2017**

Общая характеристика ГРО «ПетербургГаз»

ГРО «ПетербургГаз» газораспределительная организация, в эксплуатационной ответственности которой находится 7 907,26 км наружных газопроводов природного газа, редуцирование давления газа осуществляется на 25 136 газорегуляторных пунктах среднего и высокого давления

На обслуживании ГРО «ПетербургГаз»:

- ❖ 2 430 установок электрохимической защиты газопроводов;
- ❖ 1,3 млн. газифицированных квартир;
- ❖ 21,39 тысяч частных газифицированных домов.




За период 2016г. - 1 полугодие 2017 г. ООО «ПетербургГаз» были выполнены работы по строительству и реконструкции объектов газоснабжения и газораспределения в Санкт-Петербурге в рамках следующих инвестиционных программ:

❖ «Программа газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Санкт-Петербурга»;


❖ Программа капитальных вложений ООО «ПетербургГаз» (Программа реконструкции).

Объем освоение капитальных вложений

2016г.

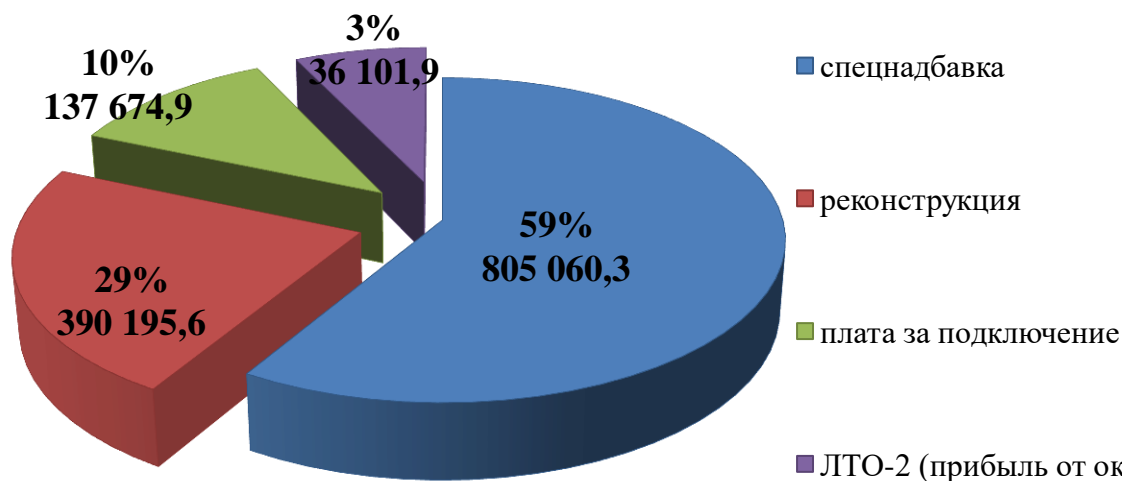

I полугодие 2017г.

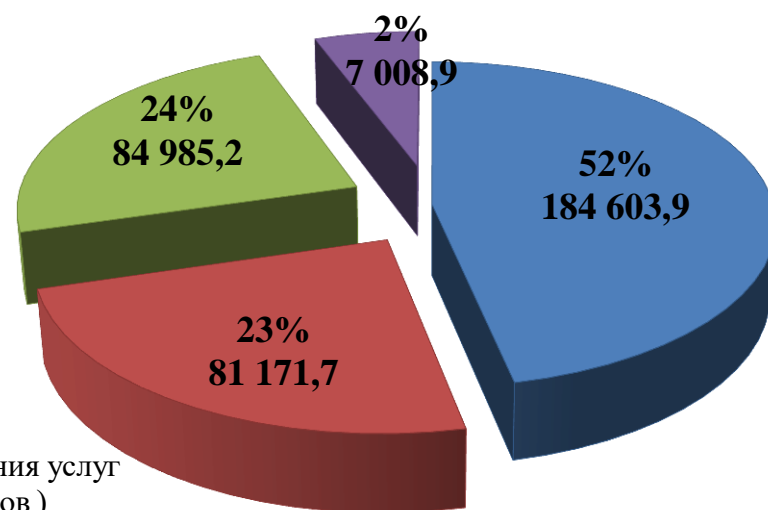

А также программы капитального ремонта.

«Программа газификации ГРО «ПетербургГаз» объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Санкт-Петербурга»

За 2016 год построено: 10,08 км газопроводов, 62 газопровода-отвода к жилым домам.

Введено в эксплуатацию: 10,95 км газопроводов, 97 газопроводов-отводов к жилым домам (включая переходящие объекты прошлых периодов).

№	Показатели	План 2016 года	Факт за 2016 год	% выполнения от плана отчетного периода	План 2017 года	План 1 полугодия 2017 года	Факт за 1 полугодие 2017 года	% выполнения от плана отчетного периода
1	Натуральные показатели (км)	8,23	10,08	>100 %	15,30	4,00	2,98	75%
2	Капитальные вложения (средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительной системе ГРО «ПетербургГаз») тыс.руб. без НДС	868 530,00	805 060,34	93%	923 770,00	278 341,35	184 603,98	66%

За 1 полугодие 2017 года построено: 2,98 км газопроводов, 26 газопроводов-отводов к жилым домам.

Введено в эксплуатацию: 1,31 км газопроводов (включая переходящие объекты прошлых периодов).

В том числе в указанный период осуществлялась газификация пос. Кондакопшино, пос. Осиновая Роща, пос. Горелово, г. Зеленогорска

В настоящее время в рамках этой программы продолжается строительство социально значимых для города объектов, таких как:


«Строительство газопровода высокого давления (1.2 МПа) от ГРС «Южная ТЭЦ» до Пулковского шоссе», диаметром 1020 мм, протяженность которого составляет 9,3 км.


Строительство данного газопровода начато в 2015 году и входит в число мероприятий для создания дополнительного кольца в системе газоснабжения Санкт-Петербурга, что позволит принять от перспективной ГРС «Шоссейная-2» и распределить в зонах перспективной застройки Пушкинского и Московского районов необходимые объемы газа, а также разгрузить существующую ГРС «Шоссейная».

На сегодняшний день **проложено 9,2 км** газопровода.

Объект планируется к вводу в 4 квартале 2017г.



Условные обозначения
 строительство газопровода

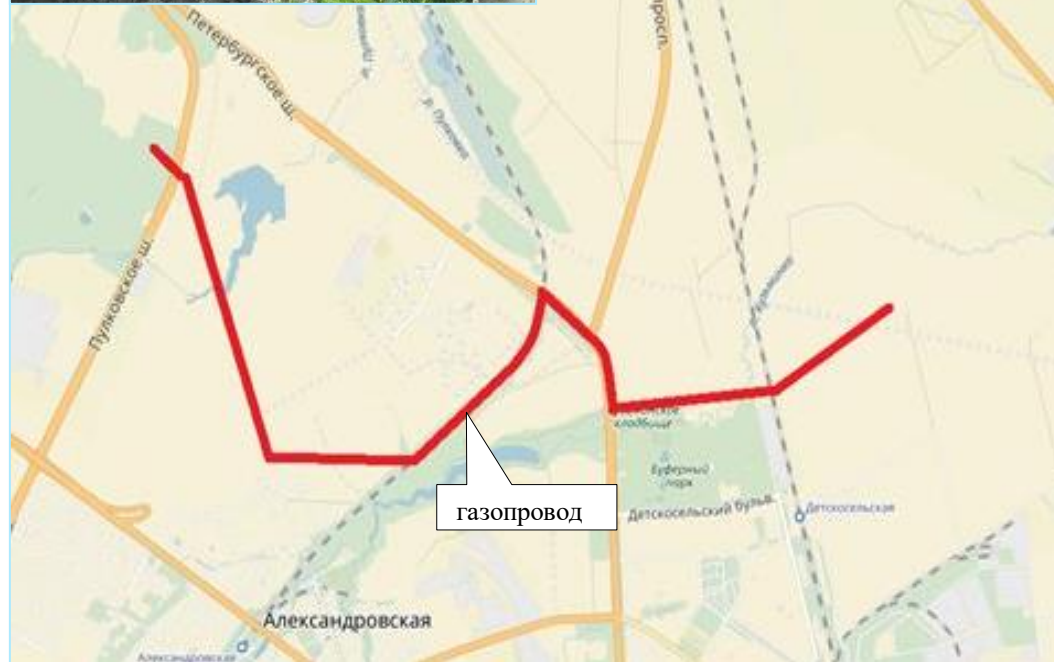


газопровод

Подходят к завершению работы по строительству **закольцовки газопровода высокого давления по перспективному продолжению Парашютной ул. и КАД от Шуваловского пр. до Горского шоссе (1 пусковой комплекс).**

Строительство газопроводов диаметром 720 мм начато в 2014 году, ввод в эксплуатацию газопровода – 4 квартал 2017 год.

Строительство данного объекта позволит повысить надежность газоснабжения существующих потребителей, расположенных на территории Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, обеспечить газоснабжением потребителей ближайшей перспективы – реконструируемой застройки мкр. Озерки, мкр. Коломяги, пос. Парголово и перспективных потребителей территории, планируемых к застройке, увеличить объем транспортировки газа от ГРС «Конная Лахта» через Лахтинский разлив в юго-западную часть Санкт-Петербурга.

Общая протяженность построенных газопроводов **составляет 2,98 км.** Объект планируется к вводу в 4 квартале 2017г.

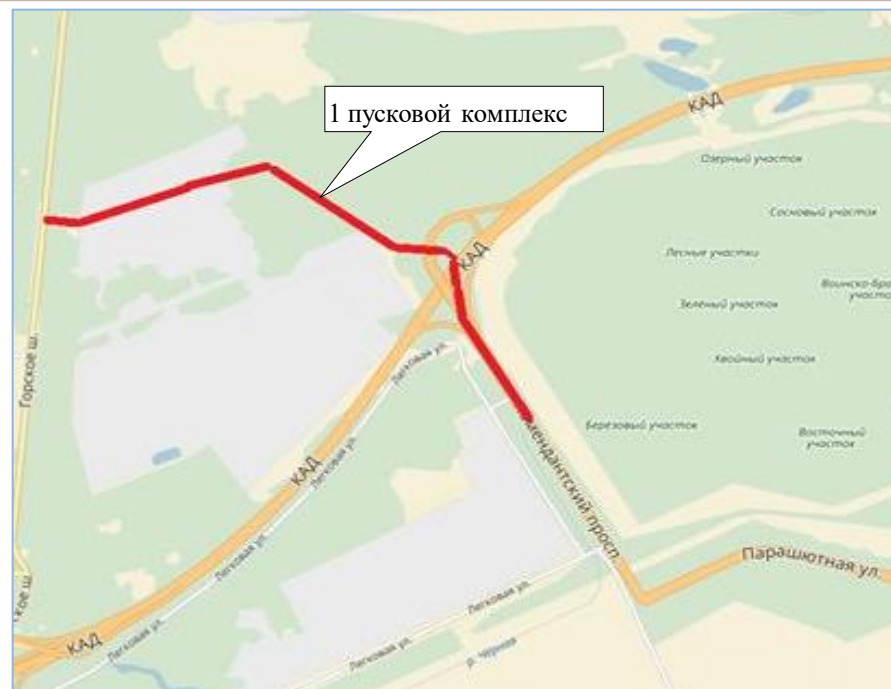


Условные обозначения

 строительство газопровода




В 3 квартале 2017 года началось строительство газопровода в.д. от ул. Руставели до увязки с газопроводом высокого давления от ГРС "Восточная-2". 1 этап – газопровод высокого давления в границах Санкт-Петербурга от существующего газопровода высокого давления, проложенного в створе Шафировского проспекта до КАД (включая КАД), проектная протяженность 4,5 км, который:

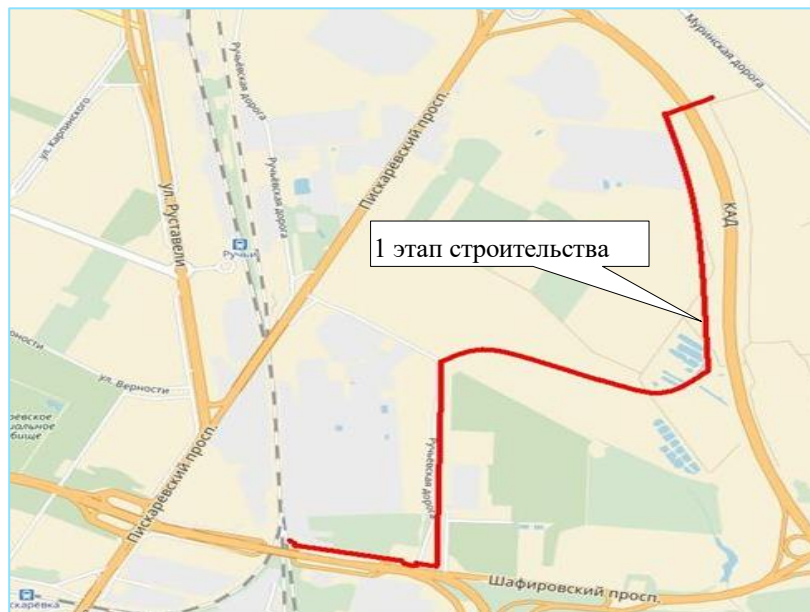

Условные обозначения
█ строительство газопровода

➤обеспечит транзит дополнительного объема газа в северо-восточное полукольцо газопроводов высокого давления и перспективный прирост объема газопотребления в максимуме до 267000м³/ч.;

Кроме того, после реализации мероприятий по объекту, будет обеспечен рост газопотребления по существующим теплоисточникам за счет новой застройки в зонах их действия, проводимой в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга, как новых территорий, так и с уплотнением и реновацией существующей застройки.

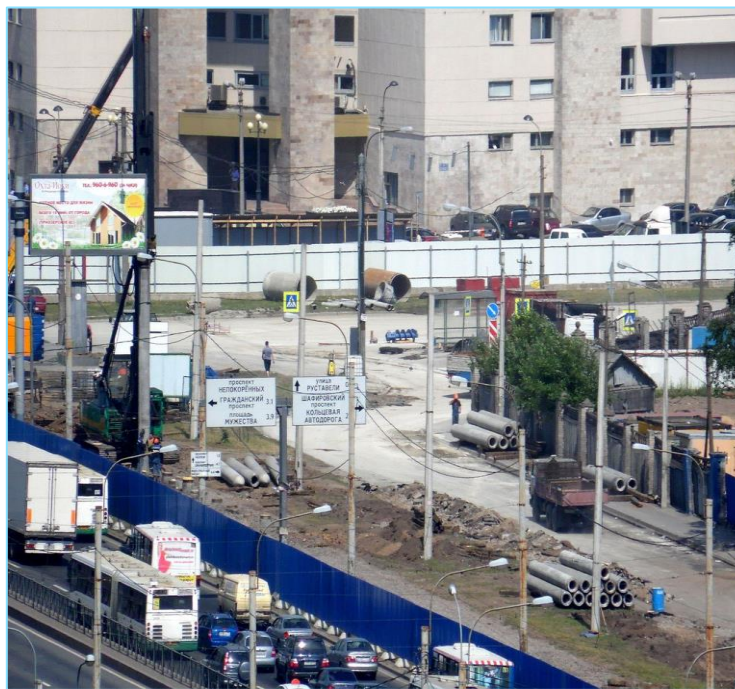

➤значительно повысит надежность работы системы газоснабжения Санкт-Петербурга в северо-восточной и восточной части города за счет перераспределения нагрузки на головных источниках газоснабжения Санкт-Петербурга (ГРС «Восточная» и ГРС «Северная»);

Так же в 2017 году началось *строительство газорегуляторного пункта (ГРП) высокого давления с комплексом подводящих газопроводов высокого и среднего давления на продолжении Детскосельского бульвара в г. Пушкине.*



Программа капитальных вложений ООО «ПетербургГаз» (реконструкции)

№	Показатели	План 2016 года	Факт за 2016 год	% выполнения от плана отчетного периода	План 2017 года	План 1 полугодия 2017 года	Факт за 1 полугодие 2017 года	% выполнения от плана отчетного периода
1	Натуральные показатели (км)	3,34	3,94	118%	13,70	2,60	1,73	67%
2	Капитальные вложения (собственные средства: амортизация и прибыль, заложенная в тариф) тыс.руб. без НДС	528 236,36	390 195,63	74%	929 227,69	131 059,20	81 171,74	62%

За 2016 год выполнены следующие работы:

- Реконструкция газопроводов: **3,94 км**
- Техническое перевооружение ГРП в части автоматизированной системы диспетчерского контроля, электроснабжения и оснащение системой безопасности: **163 объекта.**
- Полная реконструкция трех ГРП.
- Техническое перевооружение установок электрохимической защиты: **47 объектов**


Введены в эксплуатацию: 4,1 км газопроводов (включая переходящие объекты прошлых периодов).

За 1 полугодие 2017 года выполнены следующие работы:

- Реконструкция газопроводов: **1,73 км**
- Техническое перевооружение ГРП в части автоматизированной системы диспетчерского контроля: **16 объектов**
- Техническое перевооружение и реконструкция установок электрохимической защиты: **32 объектов.**

В 2017 году началась реконструкция следующих крупных объектов:


➤ Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по адресу: квартал 24 М. Охта (Новочеркасский пр.- Таллинская ул. - пр. Шаумяна - Заневский пр.)

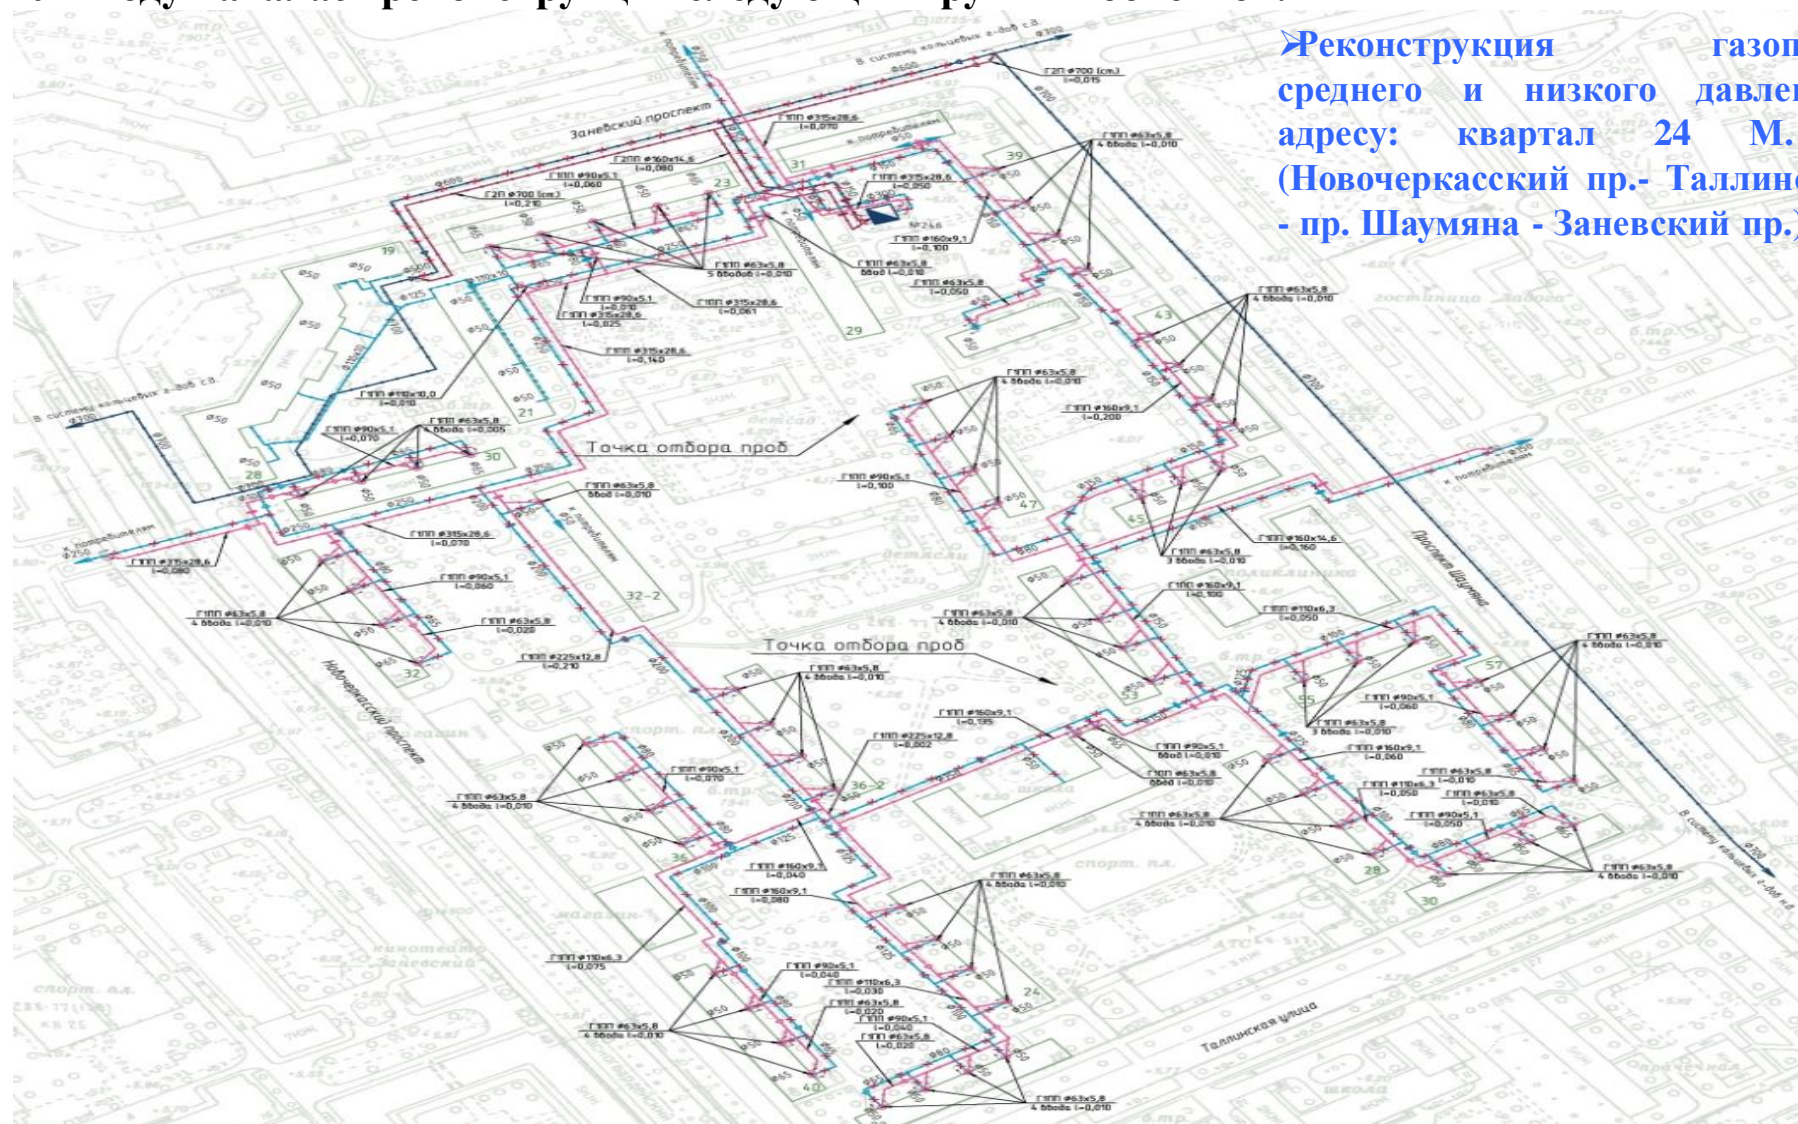

**Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по адресу:
Гражданский пр. от ул. Гидротехников до пр. Науки**



**Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления
по М. Пушкарской ул., Пушкарскому пер. и Саблинской ул.**

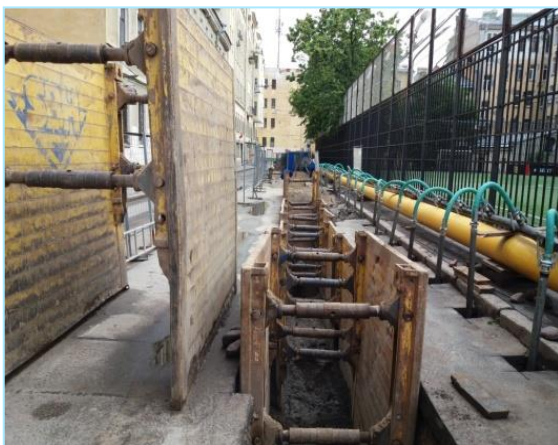

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по ул. Бабушкина




В рамках реализации Программы капитального ремонта в 2016 году выполнены следующие основные работы:

Раздел программы капитального ремонта	Ед. измерения	Выполнение	
		Подрядным способом	собственными силами (хоз. способом)
		Факт	
Капитальный ремонт зданий (ремонт кровель, восстановление фундамента, очистка, окраска зданий ГРП и объектов недвижимости)	в натуральных показателях, шт.	46	----
	по объему финансирования, тыс.руб.	92 684,31	----
Капитальный ремонт сооружений (замена, ликвидация задвижек, ремонт колодцев сетевых отключающих устройств, ремонт и очистка дюкеров)	в натуральных показателях, шт.	138	----
	по объему финансирования, тыс.руб.	186 071,71	----
Капитальный ремонт основного оборудования (ремонт оборудования, электроустановок ГРП, восстановление работоспособности молниезащиты)	в натуральных показателях, шт.	79	----
	по объему финансирования, тыс.руб.	90 096,62	----
Капитальный ремонт дефектных участков по факту выявления	в натуральных показателях, шт.	8	13
	км	0,84	1,46
	по объему финансирования, тыс.руб.	9 424,09	2 181,60
Капитальный ремонт установок защиты	в натуральных показателях, шт.	170	-----
	по объему финансирования, тыс.руб.	193 261,56	-----


План 604 147,11 тыс. руб. без НДС, Факт 573 719,88 тыс.руб. , что составляет 95% от плана

Реализация Программы Капитального ремонта 2016г.

Натуральные показатели (шт.)

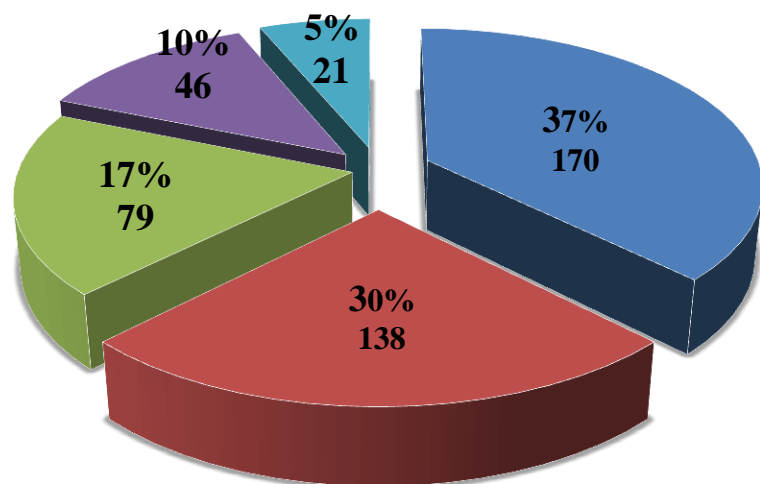

Финансовые показатели (тыс. руб.)

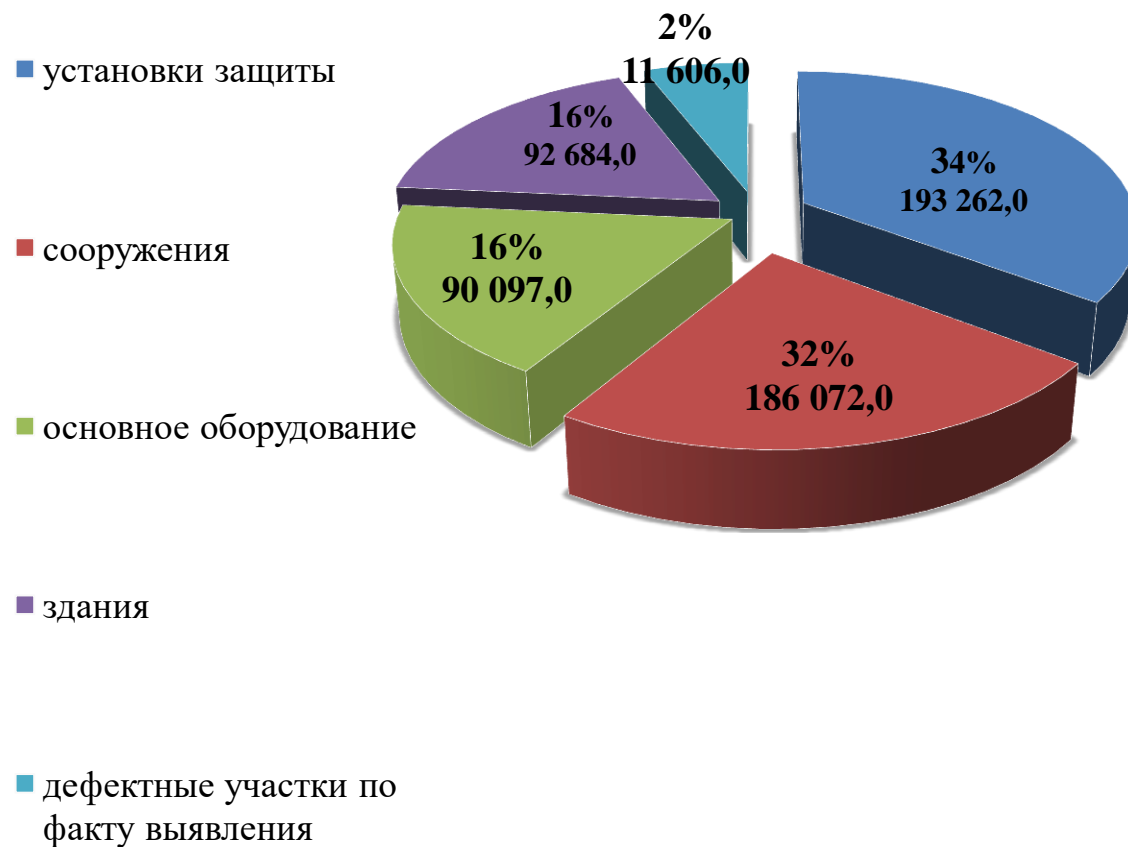


В рамках реализации Программы капитального ремонта за 1 полугодие 2017 года выполнены следующие основные работы:

Раздел программы капитального ремонта	Ед. измерения	Выполнение	
		Подрядным способом	собственными силами (хоз. способом)
		Факт	
Капитальный ремонт зданий (ремонт кровель, восстановление фундамента, очистка, окраска зданий ГРП и объектов недвижимости)	в натуральных показателях, шт.	5	-----
	по объему финансирования, тыс.руб.	11 909,18	-----
Капитальный ремонт сооружений (замена, ликвидация задвижек, ремонт колодцев сетевых отключающих устройств, ремонт и очистка дюкеров)	в натуральных показателях, шт.	34	-----
	по объему финансирования, тыс.руб.	14 779,80	124,82
Капитальный ремонт основного оборудования (ремонт оборудования, электроустановок ГРП, восстановление работоспособности молниезащиты)	в натуральных показателях, шт.	0	-----
	по объему финансирования, тыс.руб.	0,00	-----
Капитальный ремонт дефектных участков по факту выявления	в натуральных показателях, шт.	0	23
	км	0	1,91
	по объему финансирования, тыс.руб.	0	23
Капитальный ремонт установок защиты	в натуральных показателях, шт.	94	-----
	по объему финансирования, тыс.руб.	95 997,37	-----


План 571 030, 64тыс. руб. без НДС, Факт 125 337,58 тыс.руб. , что составляет 22% от плана

Реализация Программы Капитального ремонта I полугодие 2017г.

Натуральные показатели
(шт.)

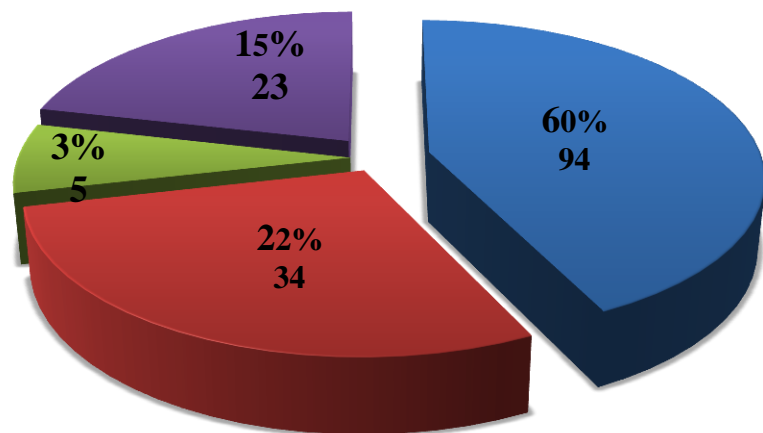

Финансовые показатели
(тыс.руб.)

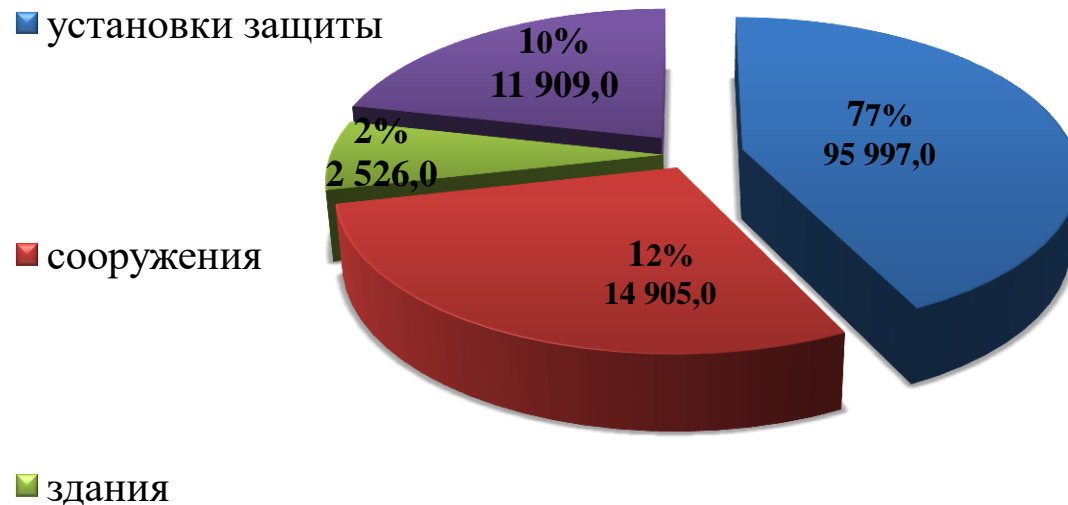

■ здания

■ сооружения

■ установки защиты

■ дефектные участки по факту выявления

Отчет о выполнении плана капитальных вложений ООО "ПетербургГаз" за 2016 год- 1 полугодие 2017 года

Итого по инвестиционным программам общества

№	Показатели	План 2016 года	Факт за 2016 год	% выполнения от плана отчетного периода	План 2017 года	План 1 полугодия 2017 года	Факт за 1 полугодие 2017 года	% выполнения от плана отчетного периода
1	Натуральные показатели (км.)	11,57	14,02	>100 %	29,00	6,60	4,71	71%
2	Капитальные вложения (тыс.руб. без НДС)	1 396 766,36	1 195 255,97	86%	1 852 997,69	409 400,55	265 775,72	65%

Таким образом, в 2016 году ООО «ПетербургГаз» в рамках инвестиционных программ **было проложено 14,02 км** газопроводов, что составило **>100% от годового плана.**

За первое полугодие 2017 года в рамках инвестиционных программ **было проложено 4,71 км** газопроводов в **натуральных показателях составило 71% от плана отчетного периода.**



Правительство
Санкт-Петербурга

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕТЕРБУРГГАЗ



Спасибо за внимание!
