

**Об итогах выполнения
Адресной программы ремонта и
Инвестиционной программы за 2016 год и
ходе реализации в 2017 году
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»**

**Марков Антон Андреевич
Директор по капитальному строительству
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»**

Исполнение в финансовом выражении:

Объект ремонта	План 2016 г., тыс. руб. без НДС	Факт 2016 г., тыс. руб. без НДС	% выполнения годового плана
Тепловые сети	804 591	771 976	96%
Технологические объекты, транспорт, связь	36 903	39 100	106%
Здания	69 089	5 669	8%
Материалы и оборудование	138 522	195 036	141%
ИТОГО	1 049 105	1 011 781	96%

Исполнение в натуральном выражении:

Показатель	План 2016 г., п.м труб	Факт 2016 г., п.м. труб	% выполнения годового плана
Магистральные тепловые сети	4 500	4 626	103%
Квартальные тепловые сети	20 500	20 352	99%
ИТОГО	25 000	24 978	100%

Ход реализации в финансовом выражении:

Объект ремонта	План 2017 г., тыс. руб. без НДС	Факт 1 полугодие, тыс. руб. без НДС	% выполнения годового плана
Тепловые сети	838 196	266 790	32%
Технологические объекты, транспорт, связь	36 249	13 441	37%
Здания	62 542	1 898	3%
Материалы и оборудование	154 436	47 797	31%
ИТОГО	1 091 423	329 926	30%

Ход реализации в натуральном выражении:

Показатель	План 2017 г., п.м труб	Факт 1 полугодие, п.м труб	% выполнения годового плана
Магистральные тепловые сети	5 500	1 141	21%
Квартальные тепловые сети	19 500	5 076	26%
ИТОГО	25 000	6 217	25%

Исполнение в финансовом выражении:

Источник финансирования	Финансовые потребности на 2016 г. (согласно ИП 2015-2018 гг.) , тыс. руб. без НДС	Утвержденные источники в тарифе на 2016 г. , тыс. руб. без НДС	Факт 2016 г. , тыс. руб. без НДС
Амортизация	2 205 549,00	2 177 924,00	2 202 591,00
Прибыль	0	145 961,39	168 790,45
Плата за подключение	1 831 804,09	642 918,74	717 836,27
Прочие (кредитные средства)	97 289,99	0	0
ИТОГО	4 134 643,08	2 966 804,13	3 089 217,72

Исполнение в натуральном выражении:

Показатель	План 2016 г., п.м труб	Факт 2016 г., п.м труб	% выполнения годового плана
Реконструкция тепловых сетей в целях повышения надежности	14 500	15 941	110%
Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей	8 942	17 487	196%
ИТОГО	23 442	33 428	143%

Наименование объекта	Объем выполненных в 2016 году работ
Тепломагистраль Восточная (от ТК-11 до ТК-36)	Реконструировано более 500 п.м трубопроводов Ду800-700 в проезжей части Большого пр-та В.О. между 22-23 и Кадетской линиями. Срок завершения реконструкции - июнь 2017 года.
Тепломагистраль 2-я Главная (от ТК-56а до ТК-44; от ТК-13 до ТК-8)	Реконструировано более 1300 п.м трубопроводов Ду600-400 в историческом центре города - в проезжей части улиц Кирочная и Чайковского от Литейного пр-та до Моховой ул.
Распределительная сеть Тверская (от ТК-3 до ТК-5; от ТК- 140 до ТК-2)	Реконструировано более 500 п.м трубопроводов Ду400-300 в проезжей части Тверской улицы от Таврической до Одесской ул.
Тепломагистраль 1-я Синопская (от ТК-9 до УВВ-13)	Реконструировано более 700 п.м трубопроводов Ду600 в проезжей части Тульской улицы от Синопской наб. с пересечением Новгородской ул.
Распределительная сеть на электродепо «Южное»	Построено 1100 п.м трубопроводов Ду400 для подключения электродепо «Южное». Впервые применен метод горизонтального шнекового бурения для возможности бестраншейного пересечения Софийской ул. Срок подключения по требованию администрации Санкт-Петербурга составил менее 10 месяцев.

Ход реализации в финансовом выражении:



Источник финансирования	Финансовые потребности на 2017 г. (согласно ИП 2015-2018 гг.) , тыс. руб. без НДС	Утвержденные источники в тарифе на 2017 г. , тыс. руб. без НДС	Факт 1 полугодие, тыс. руб. без НДС
Амортизация	2 279 336,00	2 241 903,15	677 155
Прибыль	0,00	149 319,90	57 180
Плата за подключение	770 296,17	-	127 000
Прочие (кредитные средства)	0	0	0
ИТОГО	3 049 632,17	2 391 223,05	861 335

Ход реализации в натуральном выражении:

Показатель	План 2017 г., п.м труб	Факт 1 полугодие, п.м труб	% выполнения годового плана
Реконструкция тепловых сетей в целях повышения надежности	11 674	5 976	51%
Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей	8 102	771	10%
ИТОГО	19 776	6 747	34%

Наименование объекта	Объем запланированных работ
Тепломагистраль Восточная от ТК-11 до ТК-36 (заключительный этап)	Реконструкция более 3700 п.м трубопроводов Ду800-200 в проезжей части Большого пр-та В.О. между 22-23 и Кадетской линиями. Срок завершения реконструкции - июнь 2017 года.
Рылеевская т/м от ТК-31 до ТК-36	Реконструкция 500 п.м трубопроводов Ду600 по ул. Пестеля от Моховой ул. до Литейного пр. с его пересечением (до ТК-36)
Распределительная сеть 3-я Красноармейская от ТК-150 (т/м Северная ТЭЦ-15) до ТК-27	Реконструкция более 2 300 п.м трубопроводов Ду250-80 в проезжей части 3-й и 8-й Красноармейской улицы от Московского проспекта до дома 5 по 8-й Красноармейской улице с пересечением Советского переуллка, Измайловского проспекта, улицы Егорова и Якобштадского переуллка
Тепломагистраль Северная ТЭЦ-14 от НО (у д.48) за Пр. у НО-36 до ТК-36	Реконструкция 600 п.м трубопроводов Ду1000 по улице Маршала Говорова от улицы Метростроевцев до дома 50 по улице Шкапина с её пересечением, включая пересечение действующих ж/д путей
Распределительная сеть М.Казакова ТК-6 лево, ТК-3 лево; р/с Ленинская ТК-1 право, ТК-3а право	Реконструкция более 2300 п.м трубопроводов Ду400-50 в квартале 1 Юго-Запад, ограниченном улицами Маршала Казакова, Маршала Жукова, Ленинским проспектом и проспектом Стачек (2-й участок)
Тепловой ввод от ТК-15 р/с Космонавтов	Реконструкция более 1200 п.м трубопроводов Ду700-50 по территории Физкультурно-оздоровительного комплекса Московского района по адресу (пр. Космонавтов, 47) с пересечением открытым способом пр. Космонавтов

Сроки службы тепловых сетей на территории г. Санкт-Петербурга, км. труб

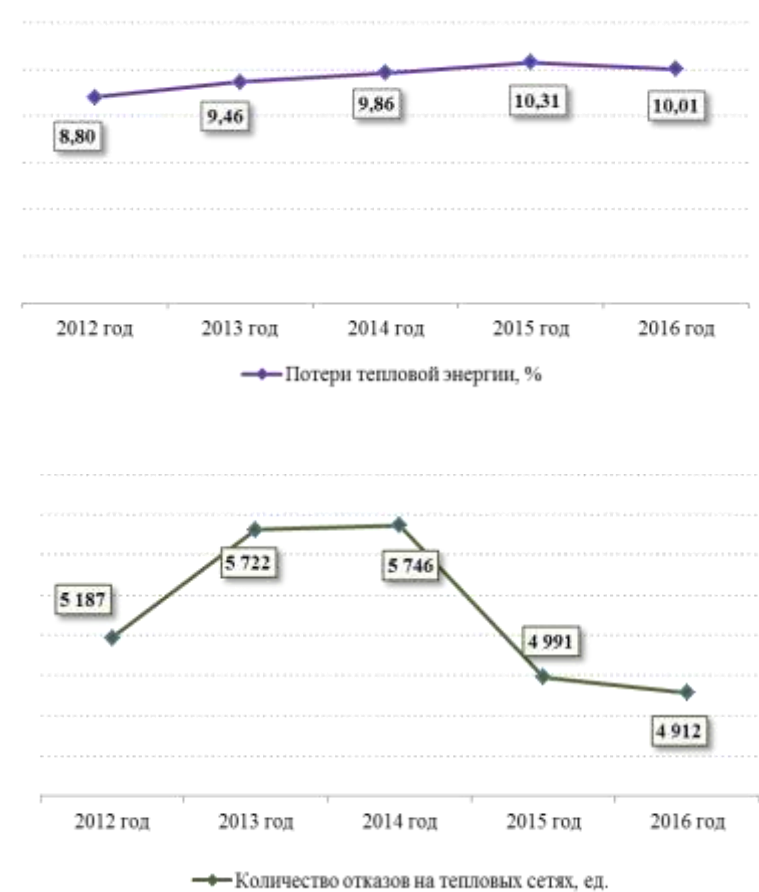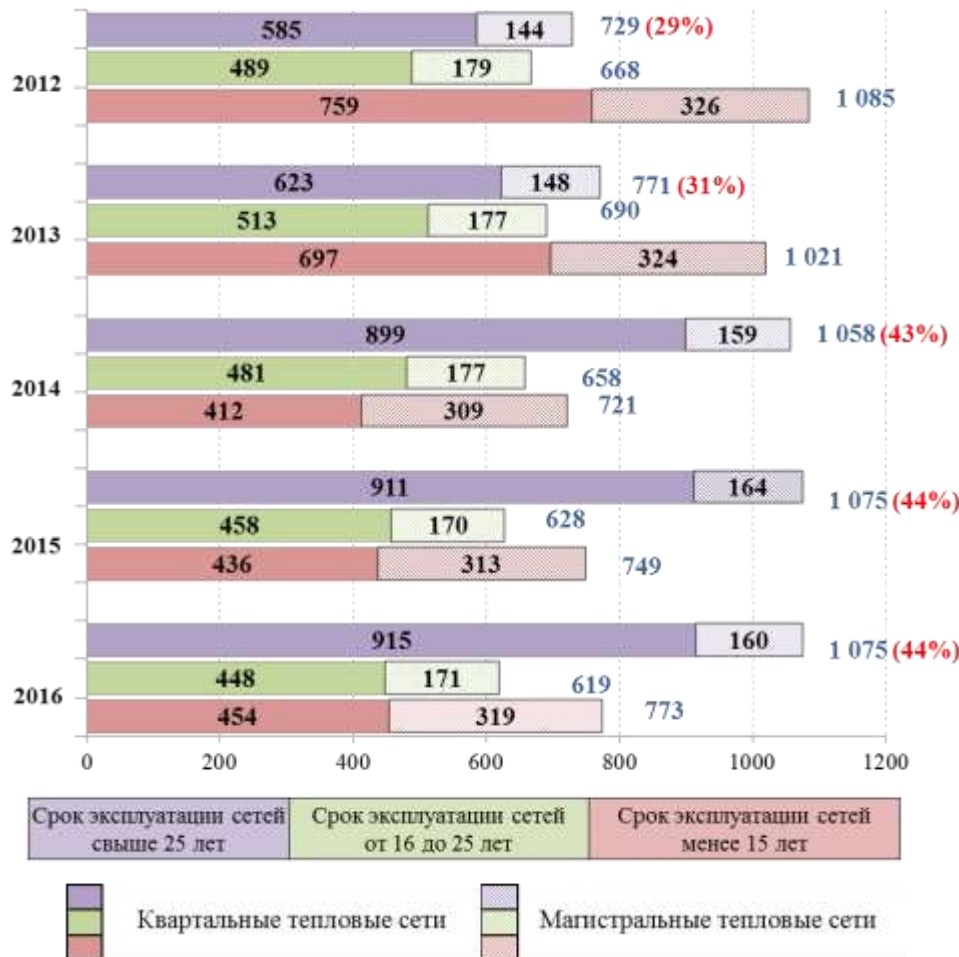

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
